

Специфікація

№	Найменування робіт			
1	Монтаж CONTAINEX Мобільне приміщення 34285х6055х2800 мм з 14 шт. BM20-CONTAINER Офісних блок-контейнерів 20' 9476719	послуга		
Складається в 1 поверх (перспектива до 3-х пов.) з окремих офісних-побутових блок-контейнерів CONTAINEX типу Транспак: 20-ти футових – 14 шт. Розміри окремих контейнерів виготовлені по ISO нормам 20-ти футових: довжина – 6055 мм, ширина – 2435 мм, висота – 2800 мм, внутрішня висота – 2540 мм. Окремий модуль складається зі стабільної рамкової конструкції та замінних стінових панелей. Модулі можуть з'єднатися між собою з лицевої, бокової сторони або ставитися один на одного до 3-х поверхів. Збірка виконується у відповідності з «Керівництвом по збірці блок-контейнерів CONTAINEX типу Транспак».				

КОМПЛЕКТАЦІЯ


№	Найменування	Од.	Кількість
1	Вікно ПВХ з однокамерним склопакетом, 945х1200мм	шт.	19
2	Інтегровані рольставні з смуговим приводом на вікнах	шт.	19
3	Вікно ПВХ санітарне з однокамерним склопакетом	шт.	2
4	Двері сталеві оцинковані покращені, теплоізоляція 40мм, зовнішній розмір 875х2000 мм	шт.	3
5	Перегородка 2200 мм	шт.	5
6	Перегородка 2200 мм з дверима 875х2000 мм	шт.	10
7	Світильник LED 30 Вт	шт.	41
8	Електричний щиток із запобіжниками	шт.	14
9	Зовнішня ел. розетка СЕЕ, вбудована в раму (вхід/вихід)	шт.	згідно плану
10	Розетки та вимикачі	шт.	згідно плану
11	З'єднувальний міжмодульний зовнішній комплект	шт.	згідно плану
12	З'єднувальний міжмодульний внутрішній комплект	шт.	згідно плану
13	Вентилятор витяжний 15Вт	шт.	4
14	Атика декоративний карниз по периметру будівлі	шт.	1

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

1. Каркас – збірно-розбірний з гвинтовим з'єднанням, сталевий пофарбований профіль товщиною 3-4 мм.
2. Стінові панелі (повні, віконні, дверні) - зйомні з пазовим з'єднанням, шир./вис.: 1200/2540 мм.
3. Покрівля - сталевий оцинкований пофарбований. Лист - 0,63 мм.
4. Зовнішня обробка - металлопрофіль 0,63мм. оцинкований з полімерним покриттям.
5. Зовнішній колір: стінових панелей, рами основи, стійок і даху – RAL 7035 (сірий), Атика декоративний карниз на кожному поверсі – RAL 3000 (червоний).
6. Внутрішня обробка стін і стелі: ламінована дерево-стружкова плита 10 мм; в санвузлах і коридорі: оцинкований з полімерним покриттям сталевий лист товщиною 0,5 мм, колір білий;
7. Колір внутрішньої обробки стін / стелі – білий / білий;
8. Покриття на підлозі - вологостійка багатошарова деревинна плита 22 мм, підлогове покриття 2 мм колір сірий;
9. Теплоізоляція - мінватна плита:
 - щільність 24 кг/м³;
 - група займистості А - не горючий;
 - товщина ізоляційного матеріалу: підлога/покрівля/стіна зовнішня – 100/100/100мм;
 - коефіцієнт термічного опору 0,35 W/7m²C.
10. Електроосвітлення:
 - світильники LED подвійні із захисними ковпаками 30 Вт;
 - вимикачі подвійні і одинарні LEGRAND.
11. Внутрішня розгалужена електрична система розрахована на освітлення, електроопалення, вентиляції і кондиціонування згідно наведеного оснащення обладнання – прихована і виконана в спеціальних внутрішніх каналах в заводському виконанні.
Електричні розетки:
 - зовнішні втоплені в рамі зовнішні розетки типу ССЄ;
 - напруга 230/400 V;
 - 50/60 Гц; 3/5-полюсной; 32 А;
 - розетки подвійні і одинарні LEGRAND.Електричний розподільний щиток:
 - розподільний щиток із запобіжниками, однорядний / дворядний;
 - FI- вимикач 40 А/0,03 А 2/4- полюсною;
 - LS- вимикач 10 А (світло) 2- полюсною;
 - LS- вимикач 13 А (конвектор) 2- полюсною;
 - LS- вимикач 13 А (розетки) 2- полюсною;Заземлення: Дріт заземлення оцинкований з хрестовим затиском. Заземлення проводиться Замовником після установки конструкції в проектне положення.
12. Звукоізоляція відповідає допустимим нормам - 33-44 дБ.
13. Максимально допустиме навантаження на підлогу - 200 кг/м².
14. Майданчик для установки – 6 опор з мінімальними розмірами 200x200 мм для кожного блок-контейнера.

План-схема

Креслення проект 9476719-002

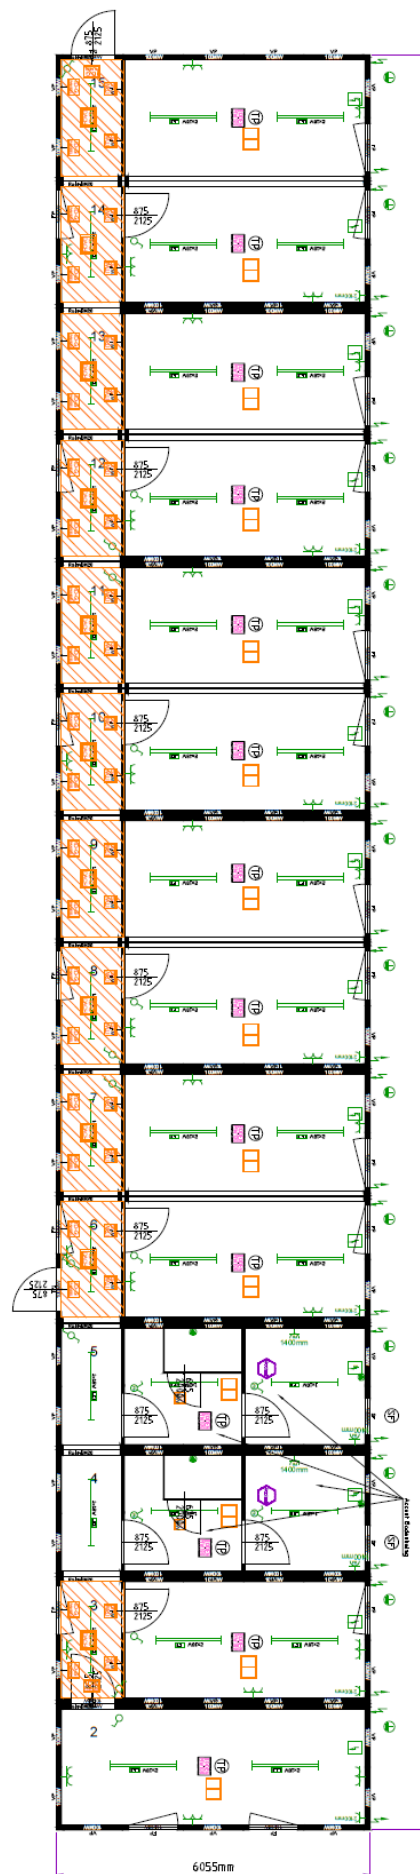

План-схема майданчику (см)

