

Формат А3

План оздоблення підлоги

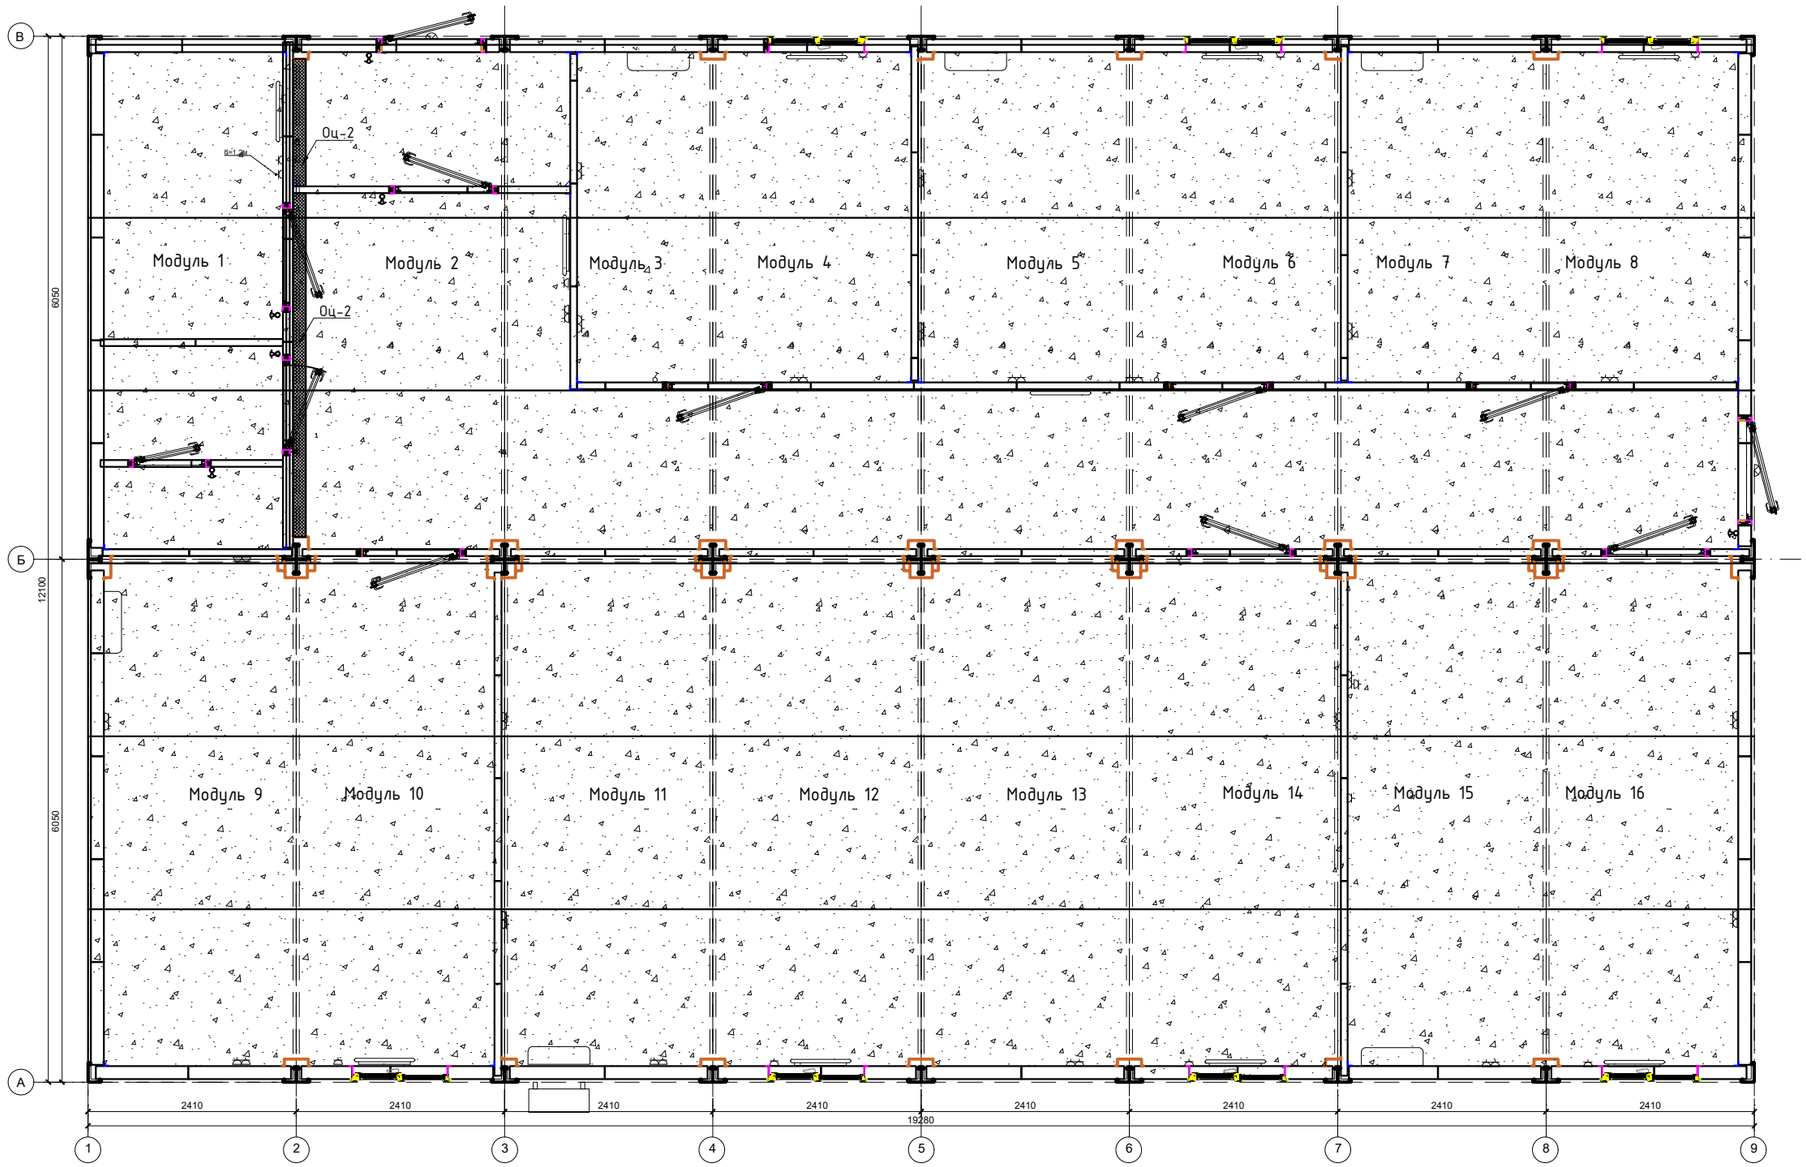

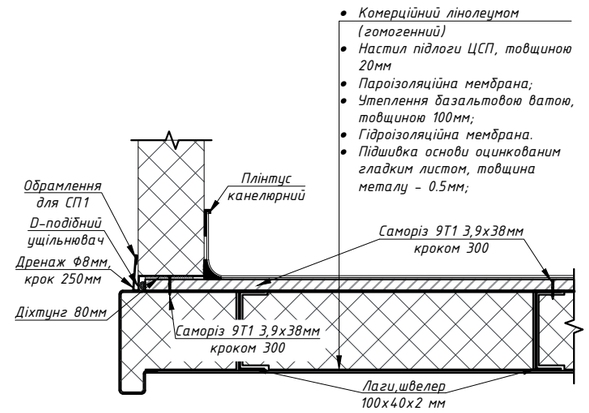

Примітка:
-Кріплення лінолеуму виконується крейовим методом.
-Завести канелюрний плінтус на стуну на 100мм
-На стики модулів встановлюються вкладки з ЦСП 20мм, підготовлені на виробництві, за допомогою саморізів 9Т1 3,8х38мм з кроком 400мм. (встановлення на монтажі)
-Після встановлення вкладишів необхідно вирівняти поверхню на стиках за допомогою рем.суміші. Після висихання рем.суміші приклеїти лінолеум
-на стик модулів 1 та 2 встановити декоративні накладки з оц. металу Див. вузли на аркуші 9.2

- Лінолеум, комерційний, гомогенний, колір – сіра крихта. Плінтус канелюрний.

						1186-АБ		
						Модульний реабілітаційний центр 233.3 м^2 м. Житомир, Україна		
Змін.	Арк.	№докум	Підпис	Дата				
						Архітектурно-будівельні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
							Р	18	27
Н. Контр.						План оздоблення підлоги	MODULEX		
Перевірив									
Розробив		Нагаєв М.С.		15.07.2026					

Зам. інв. №
Підпис та дата
Інв. № оригі.

Формат А3
