


2

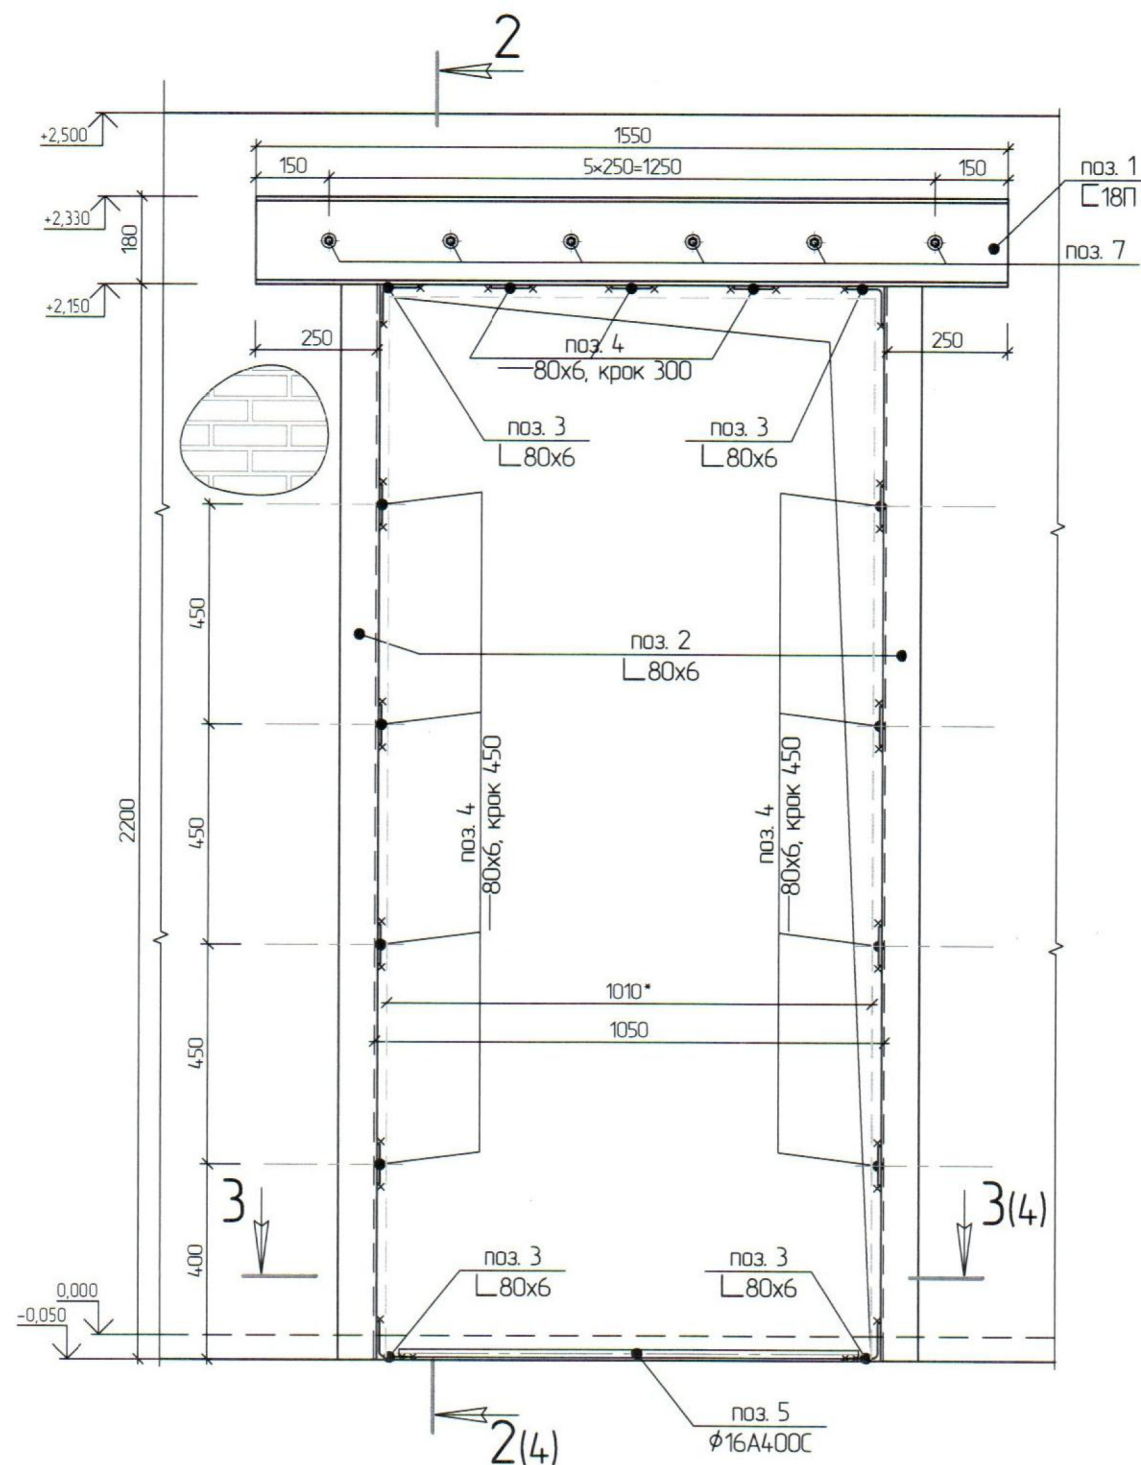

Інв. № орг.	Підпис і дата	Взам. інв. №

1. Роботи по влаштуванню прорізу виконувати після інших демонтажних робіт.
2. Нанести розмітку проєктованих прорізів та зон влаштування металоконструкцій у вибраних розмірах (див. аркуш АБ-2; Схема влаштування прорізів Пр1, Пр2; Вид А).
3. Влаштувати тимчасові опори з бруса 150×150 або будівельних домкратів (див. аркуш АБ-2; Схема влаштування тимчасових опор; Вид Б).
4. На проєктній відмітці (нижня та верхня відмітка шпори проходить по горизонтальному шву кладки) з обох сторін стіни виконати вибірку цегли під швеллери С18П (поз. 1) на глибину ≈70мм не порушуючи цілісності суміжних горизонтальних рядів цегляної кладки (див. арк. АБ-2; Розріз а-а).
5. Виконати отвори $\phi 18$ в стіні під влаштування шпильок (поз. 7) співвідсно отворам у швеллері (поз.1).
6. Поверхню шпори очистити від пилу та залишків цегли, ретельно змочити водою. На грані шпори нанести пластишний безусадочний цементно-піщаний розчин (пропорція 1:3) М200 на основі РШПЦ-М600 (далі-розчин).
7. Ввести швеллери С18П (поз. 1) у шпору на свіжоукладений розчин, стягнути їх між собою шпильками (поз. 7) не прикладаючи надмірних зусиль, та підклинити металевими пластинами по нижньому поясу. Зазори ретельно зачеканити розчином.
8. По досягненню розчином 70% від проєктної міцності (10 діб) провести обжим та фіксацію кріпильних елементів зварюванням.
9. По краям контуру ділянки стіни, що розбирається, виконати прорізи за допомогою алмазної різки та розібрати кладку починаючи з верху до низу фрагментами не більше 20-30 кг . Застосування грубого ударного інструменту не допускається.
10. З'єднати швеллери С18П (поз. 1) між собою за допомогою пластин поз 4.
11. В бокових гранях стіни виконати отвори $\phi 12$ глибиною ~200мм під влаштування арматурних стрижнів (поз. 6) або будівельних анкерів співвідсно отворам у пластині (поз. 4).
12. На очищену від штукатурного шару, брудну та пилу ділянку стіни, на свіжоукладений розчин, влаштувати кутники $\angle 80 \times 6$ (поз.2) та з'єднати їх між собою та з поз.1 кутниками $\angle 80 \times 6$ (поз. 3).
13. Накласти решту пластини поз. 4 та заанкеруватися арматурними стрижнями поз 6 або будівельними анкерами.
14. Влаштувати у проєктне положення арматуру (поз. 5) та залити мілкозернистим бетоном Б20 до чорнового рівня підлоги (≈50мм).
15. По досягненню розчином 70% від проєктної міцності (10 діб) розібрати тимчасові опори.

						Влаштування прорізів в капітальній стіні за адресою: м. Київ,			
Зм.	Кільк.	Арк.	№фок.	Підпис	Дата				
ГП						Нежитлові приміщення	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	3	6
Розробив						Розріз 1-1; Послідовність виконання робіт			
